

Jachthaven 't Zandrak

Steigerkrant 5

30 december 2021

Levering steigers

Hoofdsteigers

De hoofdsteigers zijn met beugels gekoppeld aan de studpalen. Laatste fase voor de hoofdsteigers is het maken en monteren van passtukken tussen diverse steigerdelen. Tevens dient nog koppeling van de toegangssteiger en de nieuwe hoofdsteiger plaats te vinden, evenals het vernieuwen van het loopdek van de toegangssteiger.



Vingersteigers

De stand van zaken m.b.t. het leveren van de vingersteigers is als hierna weergegeven.

7 x 14 mtr 7 tussenopslag x jachthaven- gekoppeld x walstroom

13 x 13 mtr 13 tussenopslag

8 x 12 mtr 7 tussenopslag



Nog te leveren:

10 x 10 mtr, 12 x 9 mtr, 1 x 16 mtr, 5 x 18 mtr, 1 x 20 mtr en 1 x 24 mtr.

Sloop steigers

Extra sloopafval (kisten onder steigers) en laatste oude steigers zijn afgevoerd. Het sloop gedeelte is hiermee afgesloten.



Electra

Voor het koppelen van elektra kasten is het noodzakelijk dat alle hoofdsteigers met passtukken met elkaar zijn verbonden. Levering van de kasten staat gepland voor 1^e week januari. Plaatsing op de steigers eind januari, i.v.m. inrichten en poeder coaten van de kasten.


De locatie op de hoofdsteigers zullen zo veel mogelijk overeenkomen met de locaties van de oude kasten.

Water

De 5 drinkwatertaps zullen op dezelfde plek komen als bij de oude steigers. Installatie van de watervoorziening zal als laatste worden aangelegd.

Verlichting

Voor de verlichting is een concept lichtplan gemaakt. Uitgangspunt zijn lantaarnpalen met LED-armaturen. E.e.a. moet nog verder uitgewerkt worden.

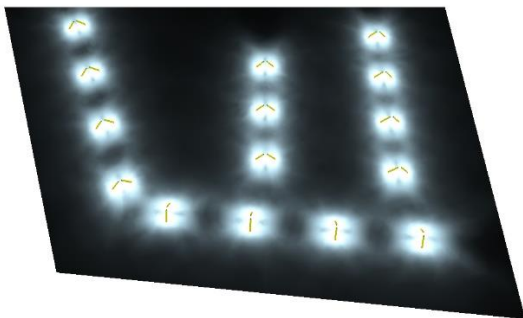

Het bestuur en de steigercommissie wensen u een prettige jaarwisseling en goed vaarseizoen toe.
